

臺北市政府工務局新建工程處 函

地址：10078臺北市中正區和平西路1段59號

承辦人：林玉婷

電話：(02)89788900分機8232

傳真：(02)23560179

電子信箱：cz_21216@mail.taipei.gov.tw

受文者：臺北市建築師公會(敬請轉知會員)

發文日期：中華民國109年11月24日

發文字號：北市工新道字第1093120683號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：為落實配合辦理本處道路更新及管線挖掘整合期程精進方案宣導會議紀錄、會議簽到簿、會議簡報資料、臺北自來水事業處宣導

(12926925_1093120683_1_ATTACHMENT1.odt、12926925_1093120683_1_ATTACHMENT2.

pdf、12926925_1093120683_1_ATTACHMENT3.pdf、12926925_1093120683_1_ATTACHMENT4.pdf)

主旨：檢送本處109年11月23日為落實配合辦理本處道路更新及管線挖掘整合期程精進方案宣導會議紀錄，請查照。

說明：

- 一、依據本處109年11月17日北市新工道字第1093117693號開會通知單續辦。
- 二、隨函檢附本案會議簡報資料供參。

正本：臺北市建築師公會(敬請轉知會員)、臺灣區綜合營造業同業公會(敬請轉知會員)、台北市不動產開發商業同業公會(敬請轉知會員)、中華民國建築經理商業同業公會(敬請轉知會員)、國防部參謀本部資通電軍指揮部資訊通聯隊第一大隊資通作業二中隊網傳作業隊、空軍台北通信資訊大隊、台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處、台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠、台灣中油股份有限公司天然氣事業部、陽明山瓦斯股份有限公司、欣欣天然氣股份有限公司、欣湖天然氣股份有限公司、大台北區瓦斯股份有限公司、微笑單車股份有限公司、臺北大眾捷運股份有限公司、台灣電力股份有限公司台北南區營業處、台灣電力股份有限公司台北市區營業處、台灣電力股份有限公司台北北區營業處、台灣電力股份有限公司台北供電區營運處、台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處、中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司臺北營運處、台灣大哥大股份有限公司、遠傳電信股份有限公司、亞太電信股份有限公司、台灣固網股份有限公司、新世紀資通股份有限公司、台灣智慧光網股份有限公司、麗

冠有線電視股份有限公司、長德有線電視股份有限公司、萬象有線電視股份有限
公司、聯維有線電視股份有限公司、新台北有線電視股份有限公司、金頻道有線
電視股份有限公司、陽明山有線電視股份有限公司、大安文山有線電視股份有限
公司、北都數位有線電視股份有限公司、臺北市政府警察局、臺北市政府民政
局、臺北市政府社會局、臺北市政府環境保護局、臺北市政府捷運工程局、臺北
市交通管制工程處、臺北市停車管理工程處、臺北市公共運輸處、臺北市商業
處、臺北市建築管理工程處、臺北自來水事業處、臺北自來水事業處各營業分處
暨工程總隊、臺北市政府警察局交通警察大隊、臺北市各區公所、臺北市政府工
務局水利工程處、臺北市政府工務局大地工程處、臺北市政府工務局公園路燈工
程管理處、臺北市政府工務局衛生下水道工程處、臺北市政府工務局新建工程處
工務科、臺北市政府工務局新建工程處養護工程隊

副本：臺北市政府工務局新建工程處道管中心（含附件）



裝

訂

52

線

臺北市政府工務局新建工程處會議紀錄


- 1、 會議事由：為落實配合辦理本處道路更新及管線挖掘整合期程精進方案宣導會議
- 2、 會議時間：109年11月23日（星期一）上午10時30分
- 3、 會議地點：本處道管中心2樓會議室
- 4、 主席：道管中心 陳宏銘主任
紀錄：林玉婷
- 5、 出席單位及人員：詳如簽到表。
- 6、 開會事由說明：(略)
- 7、 各單位意見：(略)
- 8、 會議結論：
 - (1) 請各單位落實執行本處特訂定「配合道路更新整合性挖掘標準作業流程圖」及「管線挖掘整合標準作業流程圖」，其重點為『四大整合、三大精進策略、二大SOP』。
 - (2) 因建案涉及五大管線整合重要事項，請本府建築管理工程處、臺北市建築師公會、臺灣區綜合營造業同業公會、台北市不動產開發商業同業公會及中華民國建築經理商業同業公會務必協助轉知宣導，以利達到整合目標。
 - (3) 國防部參謀本部資通電軍指揮部資訊通聯隊第一大隊資通作業二中隊網傳作業隊及空軍台北通信資訊大隊，請上述單位未來辦理通訊管網工程，請務必配合本處道路整合重大政策。
 - (4) 台灣中油股份有限公司及其相關企業辦理設置輸油管路相關道路工程，請務必配合本處道路整合重大政策。
 - (5) 本市各12區公所及本府民政局所辦理鄰里廣播線設置工

程，請配合本處道路整合重大政策。

- (6) 針對未出席單位(微笑單車股份有限公司、本府民政局及本府捷運工程局)及出席者非主管職之單位(新世紀資通股份有限公司、台灣智慧光網股份有限公司及本府工務局水利工程處)，請於文到後一周內，由科長或經理級以上人員至本處道管中心說明。
- (7) 另有關臺北自來水事業處宣導之消防栓注意事宜(詳附件)，請各單位務必配合辦理。
- (8) 另檢附本案會議簡報資料供與會單位參考。


～以下空白～

散會：上午 11 時 30 分

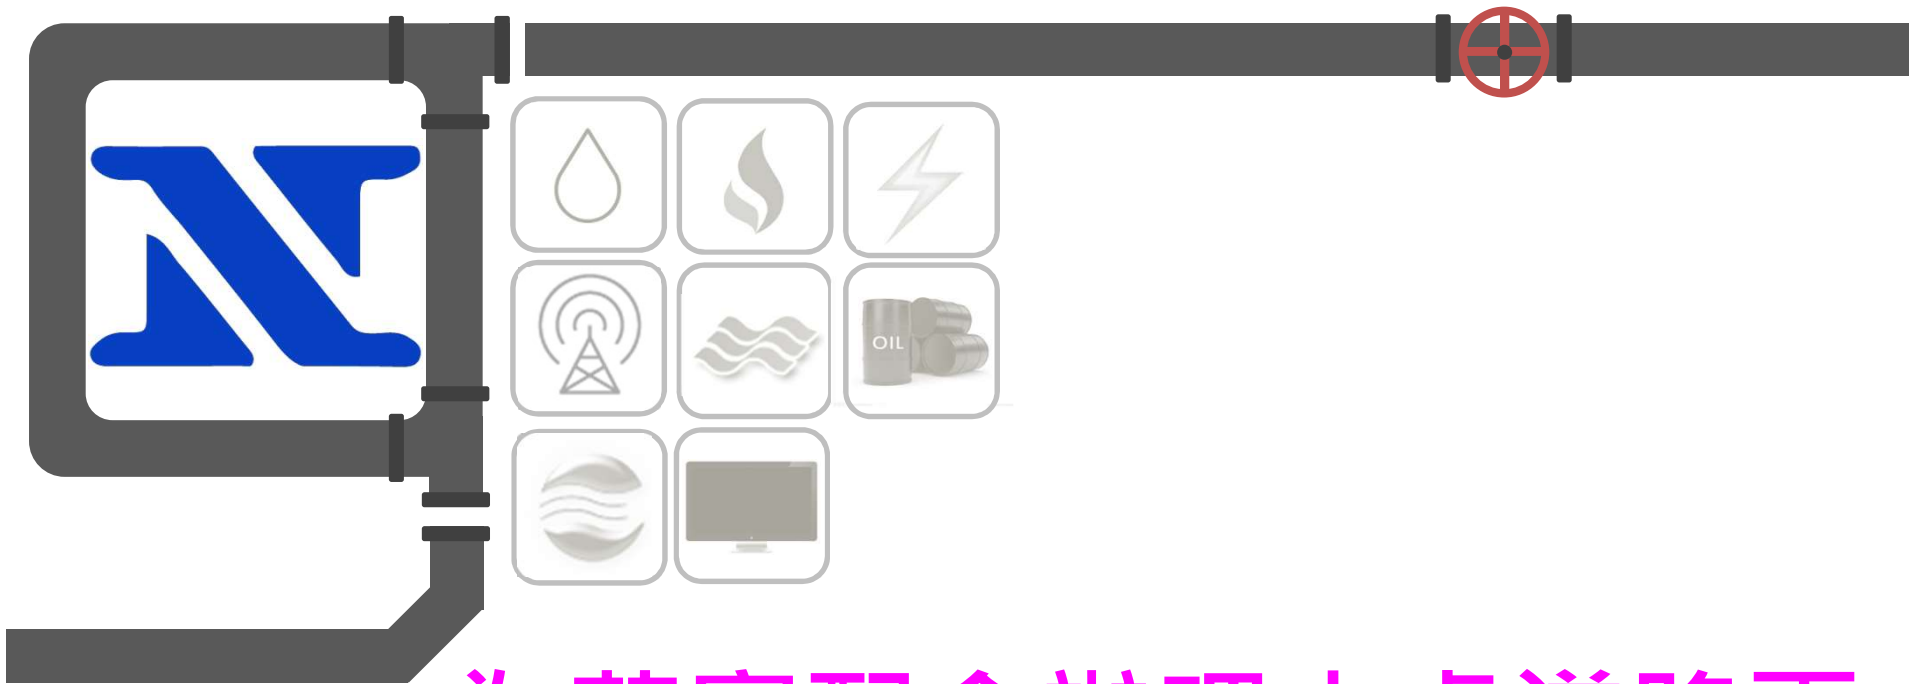

為落實配合辦理本處道路更新及管線挖掘整合期程精進方案宣導會議







一、案由報告



本市道路挖掘工程經本中心整合分挖齊補，因各工程期程過長影響民眾生活過久；且為維護本市道路平整，減少道路更新後避免管線單位重複進場挖掘施工，進而影響市民用路之權益，本處特訂定「本處配合道路更新整合性挖掘標準作業流程圖」及「本處管線挖掘整合標準作業流程圖」政策。





二、配合新工處專案道路更新整合通案性精進



採取3大精進策略

確實調查 圖資分析

1

- (1) 套繪3D圖資
- (2) 先行探挖
- (3) 管線碰撞分析
- (4) 大數據分析工率

確立要徑 併行作業


2


於要徑工期內併行作業

指定工期 落實執行

3

指定道路更新日期之前三個月完成路證申請，並於90日內完工





1、精進策略 (1/3)





1 確實調查圖資分析

❗ 一般展延工期原因分析：(1)兩天(2)變更設計

- ➡ 將要求：(1)設計前套繪3D圖資
- (2)預測可能管障點，先行探挖
- (3)施工前完成管線碰撞分析
- (4)大數據分析工率覈實給予工期

➡ 許可規費改以日計費，可改善路證申請之工期浮報

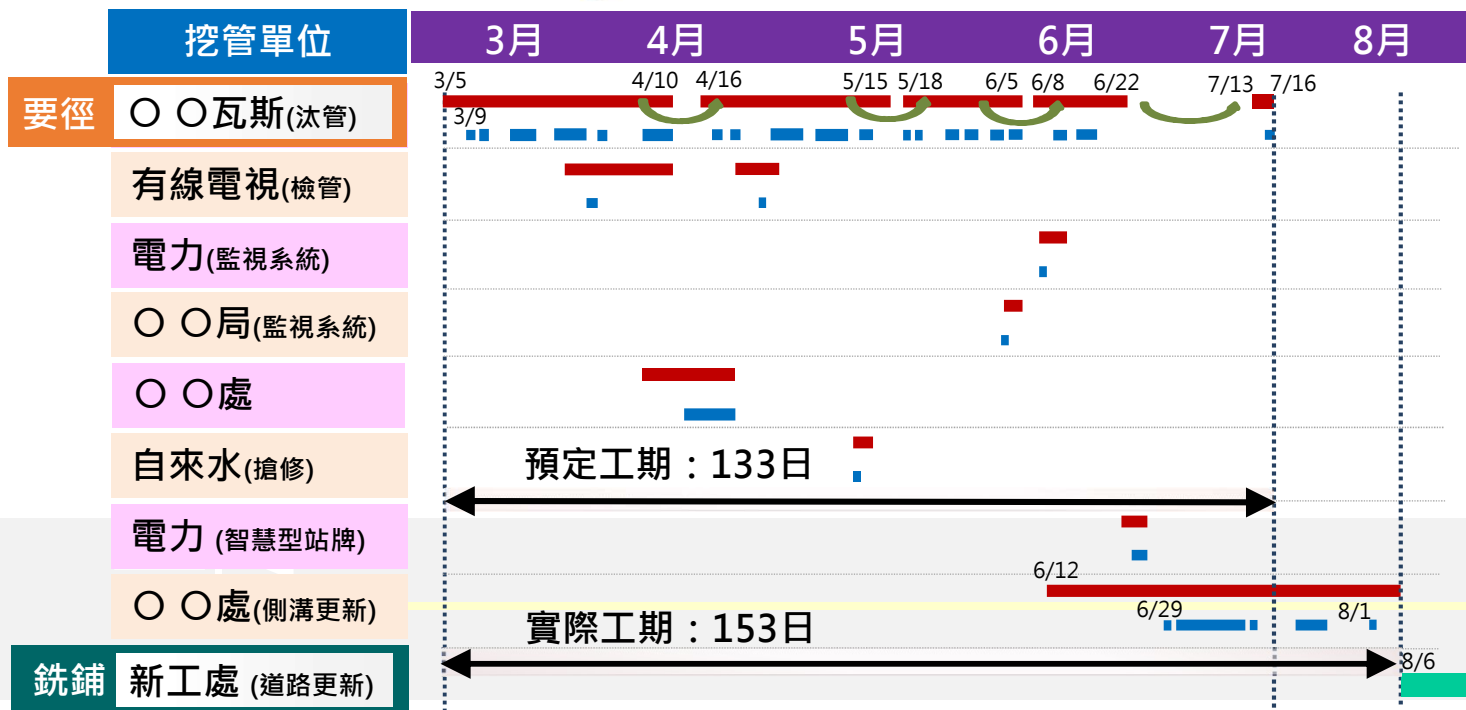





1、精進策略 (1/3)



大數據分析基本工率

經統計107至109年間，以各管線種類之每工作日可挖掘長度平均值，定義為本市基本工率：

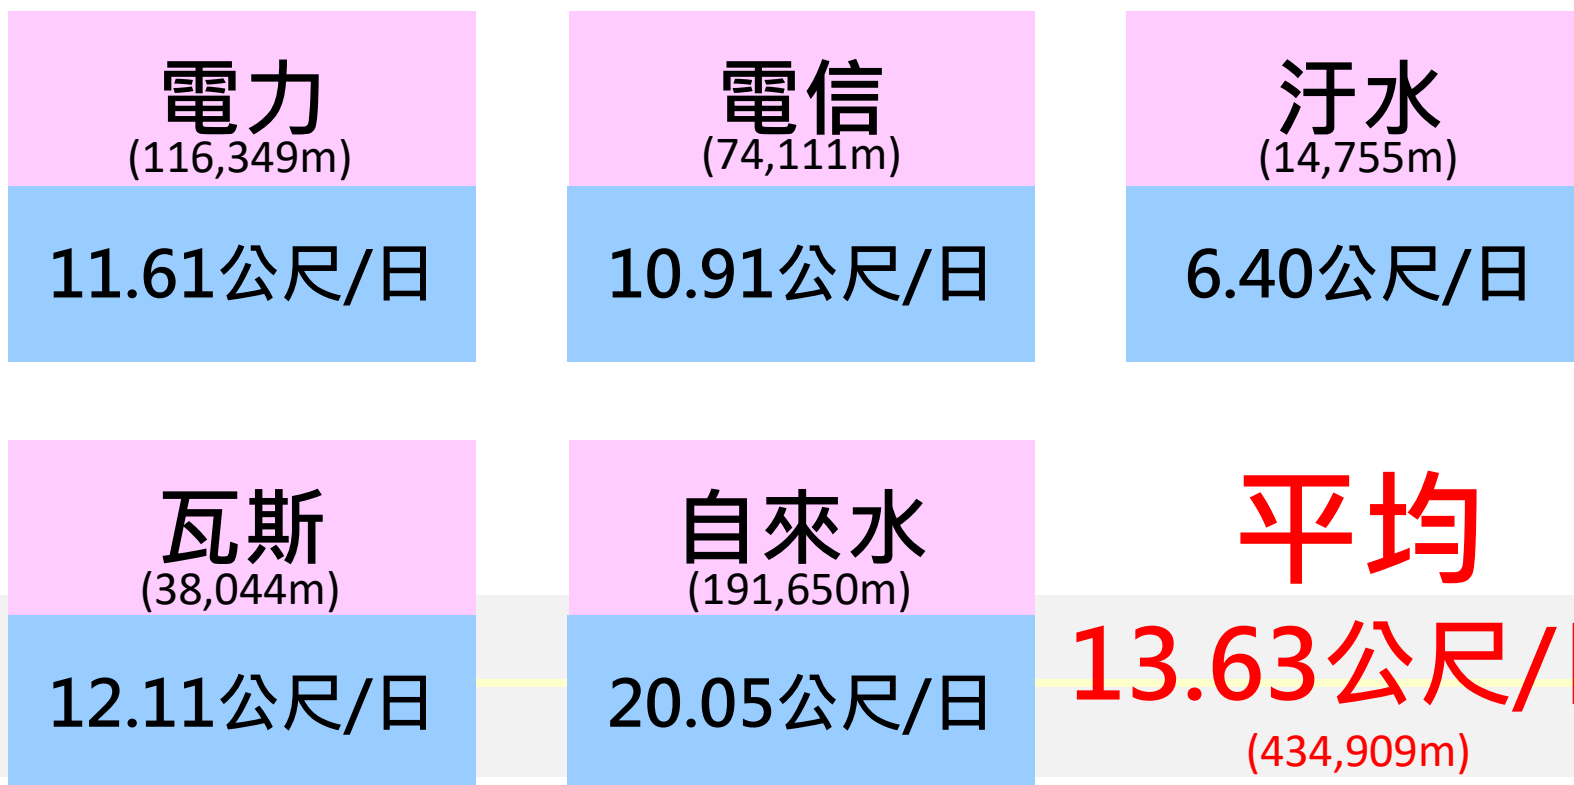




2、精進策略 (2/3)

2

確立要徑 併行作業


→ 整合時要求各管線單位於要徑工期內併行作業,並完成施工

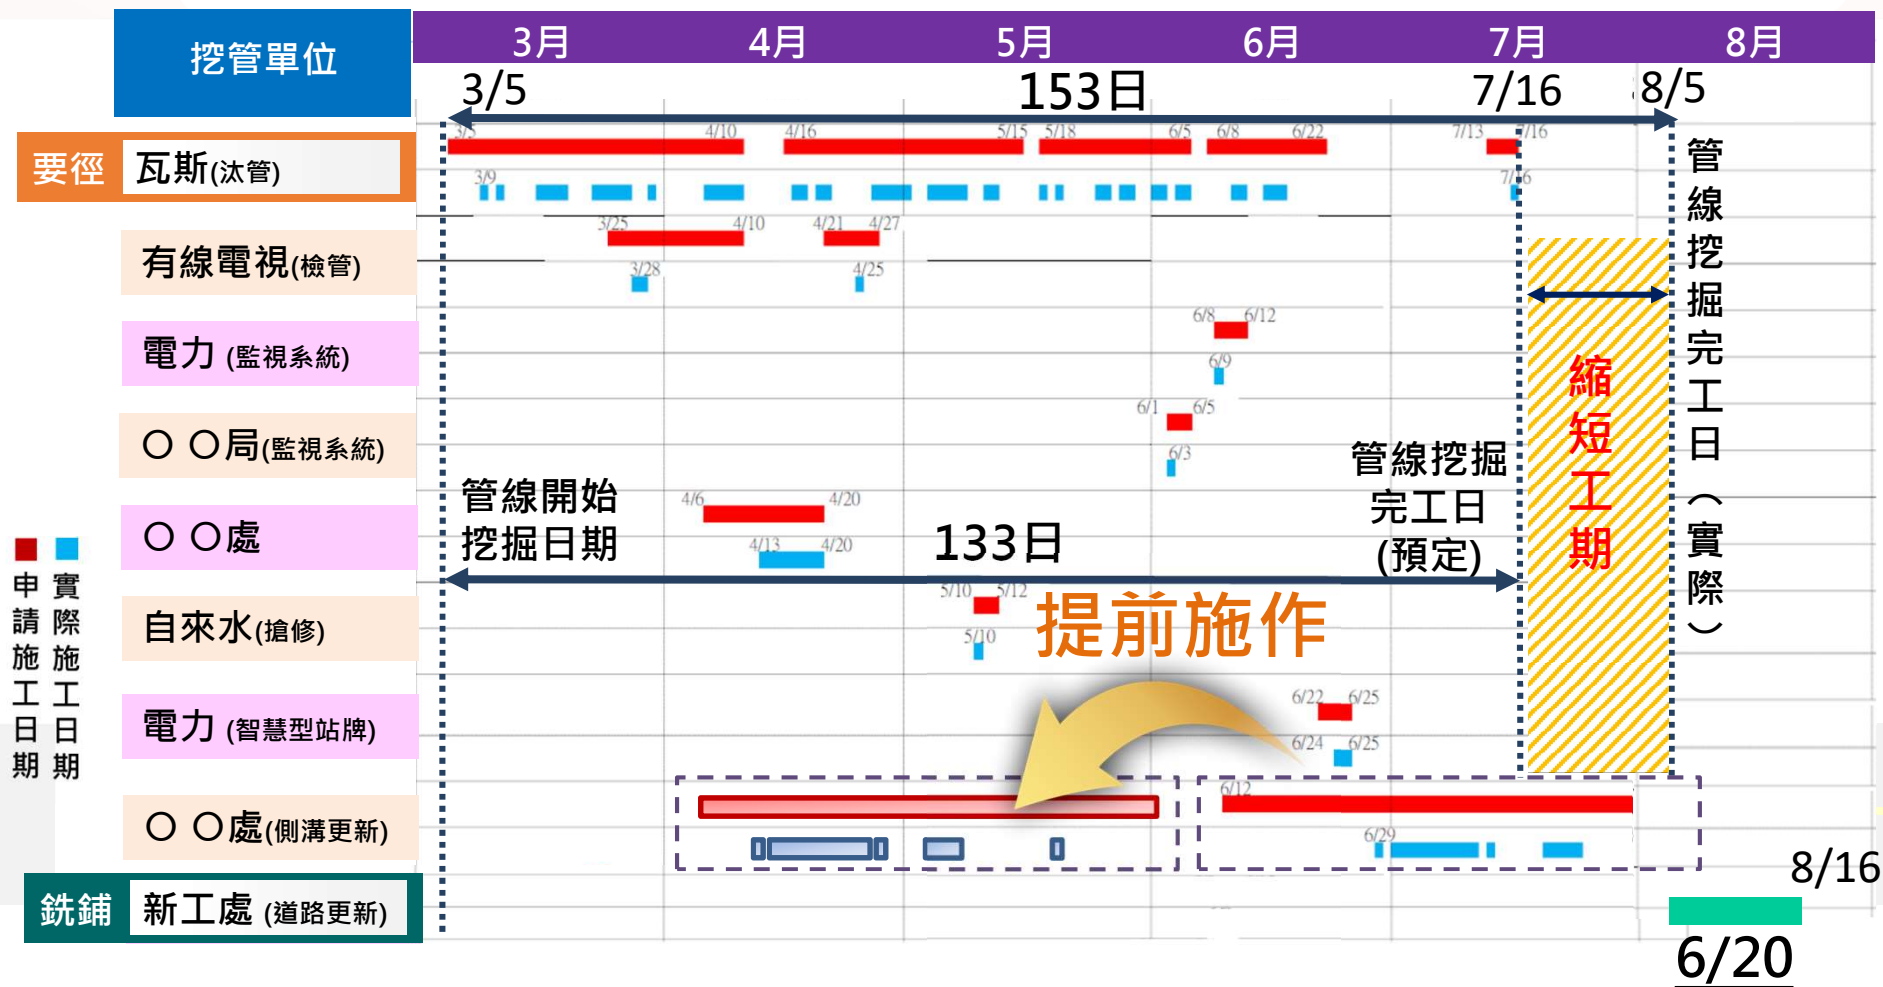


3、精進策略 (3/3)

3 指定工期 落實執行


➔ 預定道路更新前三個月，應完成路證申請；並於90日內完成挖掘作業

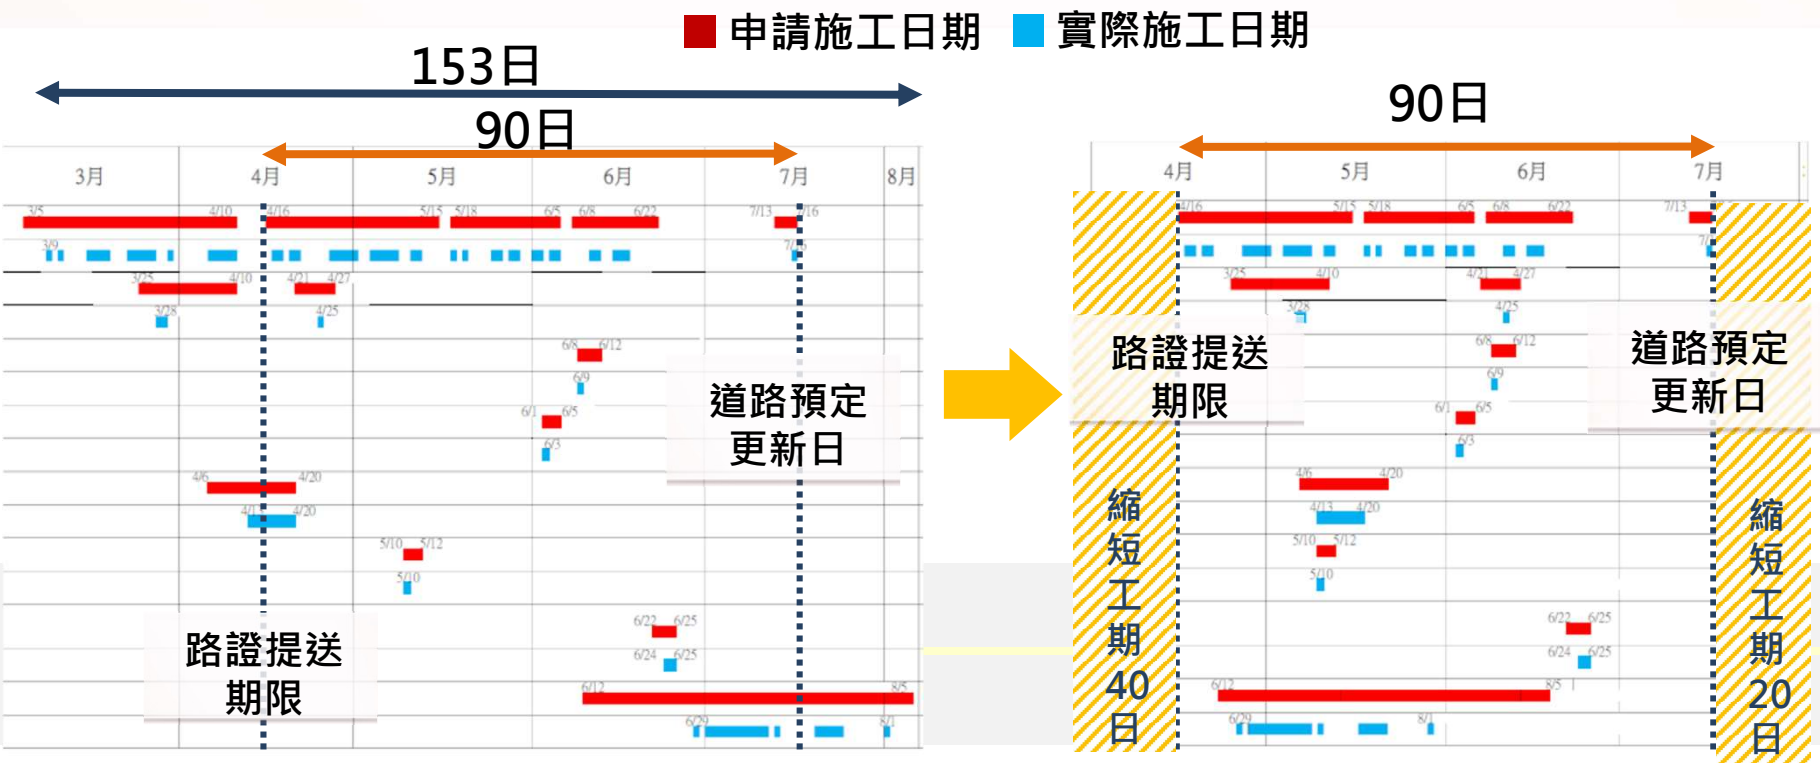



三、配合道路更新整合性挖掘標準作業流程圖

109.9.23 簽准實施

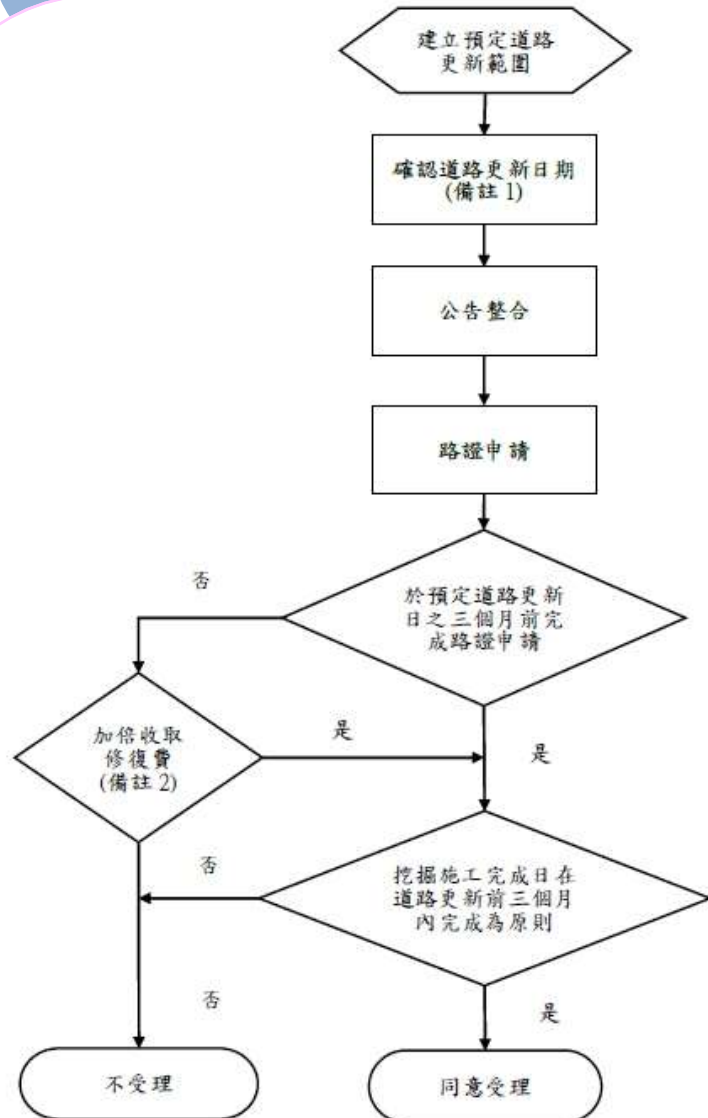

備註：

- 1、道路更新路段應比照臺北市道路挖掘管理自治條例第12條規定，於每年9月30日前，將下年度預定道路更新範圍提供各管線機關(構)擬訂配合措施，並於協調規劃統一管線挖掘之施工時段後，確認道路更新日期。
- 2、依據臺北市道路挖掘各項費用收費標準第7條第3項第2款規定，主管機關指定應進行管線挖掘整合之路段，申請人逾主管機關公告指定之時間，使提出申請，致延誤整合作業之進行，加一倍計收。

配合本處道路預定更新整合(N)(1/4)

整合N開頭

進入申請人模組

案件申請

年度計畫申請

參與道路
預定更新
整合

查年度

臺北市道路挖掘管理系統-申請人模組

<https://dig.nco.taipei/Tpdig/>

臺北市道路管線暨資訊中心

最新公告 施工資訊 預定施工路段 完工管制路段 活動管制施工事蹟 整合路段資訊

系統登入

- 2D管線圖查詢
- 3D管線GIS平台
- 申挖案件查詢
- 核准案件查詢
- 認證人員查詢
- 現場管理人員登錄
- 即時施工影像
- 下載專區
- 網站連結
- 桃園市挖掘系統備援

網站導覽

總瀏覽人數: 9785,493人
今日瀏覽人數: 1,665人
目前線上人數: 50人

臺北市政府 臺北市工務局 臺北市新工處 內政部營建署 桃園市挖掘系統備援 無障礙網頁連結

配合本處道路預定更新整合(N)(2/4)

臺北市道路挖掘管理系統 申請人模組

單位：交工處 | 登錄者：廖光焜

1 回首頁 | 登出 | 線上人數：296

| | | |
|--------|----------|-------|
| 案件申請 | 道路挖掘申請 | 共0件 |
| 案件統計查詢 | 搶修案件申請 | 共5件 |
| 挖掘管制 | 人手孔施工作業 | 共1件 |
| 地理資訊查詢 | 道路維護施工報備 | 共104件 |
| 山區道路挖掘 | 建築復舊施工報備 | 共0件 |
| 系統管理 | 挖管證明申請 | 共26件 |
| | 年度計畫申請 | 共0件 |
| | 機動性整合申請 | 共0件 |
| | 許可證擴充報備 | 共0件 |
| | 施工期程管理 | 公告 |

| 訊息提示 | |
|--------------|-------|
| 7日內許可證書函列印 | |
| 7日內查報違規案件通知 | 共7件 |
| 7日內核准結案案件 | 共6件 |
| 規費待繳 | 共24件 |
| 修復費待繳 | 共0件 |
| 違規罰鍰待繳 | 共0件 |
| 搶修待補辦 | 共0件 |
| 搶修補辦遭退件未重新申請 | 共0件 |
| 待結案 | 共270件 |

配合本處道路預定更新整合(N)(3/4)

案件申請模組/年度計畫申請>

查詢條件


提列查詢 參與年度整合計畫 參與道路預定更新整合

年度 編號 路段 行政區

共計：89筆

1 2 3 4 5 6 7 8 9

| 序號 | 整合編號 | 整合會議召開日期 | 整合申挖截止日期 | 施工範圍 | 我要配合 | 施工範圍圖 | 詳細資料 |
|----|---------|-----------|-----------|------------------------|------|-------|------|
| 1 | N110001 | 110/10/28 | 110/12/31 | 故宮路(全線) | | | |
| 2 | N110002 | 110/12/31 | 110/12/31 | 德行西路(磺溪街至文林路) | 是 | | |
| 3 | N110003 | 110/12/31 | 110/12/31 | 通河街(85號至177號) | | | |
| 4 | N110004 | 110/12/31 | 110/12/31 | 福華路(德行西路至東華橋及建民橋至德行西路) | | | |
| 5 | N110005 | 110/12/31 | 110/12/31 | 天玉街(1號至5-1號) | | | |
| 6 | N110006 | 110/12/31 | 110/12/31 | 天母北路(全線) | | | |



配合本處道路預定更新整合(N)(3/4)



點選詳細資料與施工範圍，是否有需要配合參與請打勾

共計：89筆

| 序號 | 整合編號 | 整合會議召開日期 | 整合申挖截止日期 | 施工範圍 | 我要配合 | 施工範圍圖 | 詳細資料 |
|----|---------|-----------|-----------|---------------|--------------------------|-------|------|
| 1 | N110001 | 110/10/28 | 110/12/31 | 故宮路(全線) | <input type="checkbox"/> | | |
| 2 | N110002 | 110/12/31 | 110/12/31 | 德行西路(磺溪街至文林路) | <input type="checkbox"/> | | |
| 3 | N110003 | 110/12/31 | 110/12/31 | 通河街(95號至177號) | <input type="checkbox"/> | | |

案件申請模組/年度計畫申請>

道路預定更新資料

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| 整合編號 | N110001 | 整合會議召開日期 | 110/10/28 | 整合申挖截止日期 | 110/12/31 |
| 施工範圍圖 | | | | | |
| 工程範圍說明 | 故宮路(全線) | | | | |
| 主辦機構應辦事項 | | | | | |
| 配合參與 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| <input type="button" value="儲存"/> | | | | <input type="button" value="回上一頁"/> | |



管線機關年度整合計畫(A)(1/2)

案件申請模組/年度計畫申請>

查詢條件


提列查詢 參與年度整合計畫 參與道路預定更新整合

年度 編號 路段 行政區

共計：46筆

1 2 3 4 5

| 序號 | 整合編號 | 整合會議召開日期 | 整合申挖截止日期 | 申請單位 | 施工範圍 | 重疊件數 | 我要配合 | 詳細資料 | 施工位置圖 |
|----|---------|-----------|-----------|------|----------------------|------|------|------|-------|
| 1 | A109043 | 108/11/15 | 108/12/31 | 水利處 | 木新路3段155巷8弄2號至215巷 | 0 | | | |
| 2 | A109044 | 108/11/15 | 108/12/31 | 水利處 | 福港街219至239號、246至282號 | 0 | | | |
| 3 | A109045 | 108/11/15 | 108/12/31 | 水利處 | 新北投捷運站大業路側(光明路至育仁路間) | 0 | | | |
| 4 | A109046 | 108/11/15 | 108/12/31 | 台電市區 | 羅斯福路四段 | 0 | 是 | | |



管線機關年度整合計畫(A)(2/2)



點選詳細資料與施工範圍，是否有需要配合參與 請打勾

共計：46筆

1 2 3 4 5

| 序號 | 整合編號 | 整合會議召開日期 | 整合申挖截止日期 | 申請單位 | 施工範圍 | 重覆件數 | 我要配合 | 詳細資料 | 施工位置圖 |
|----|---------|-----------|-----------|-------|-------------------|------|--------------------------|------|-------|
| 11 | A109060 | 108/11/15 | 108/12/31 | 陽明山瓦斯 | 中山北路6段88號至200號 | 0 | <input type="checkbox"/> | | |
| 12 | A109061 | 108/11/15 | 108/12/31 | 陽明山瓦斯 | 中山北路6段200號至405巷口 | 0 | <input type="checkbox"/> | | |
| 13 | A109062 | 108/11/15 | 108/12/31 | 陽明山瓦斯 | 中央北路1段(光明路口至大業路口) | | <input type="checkbox"/> | | |

案件申請模組/年度計畫申請>

年度計畫整合資料

| | | | | | |
|------|---------|----------|-----------|----------|-----------|
| 整合編號 | A109060 | 整合會議召開日期 | 108/11/15 | 整合申挖截止日期 | 108/12/31 |
|------|---------|----------|-----------|----------|-----------|


施工範圍圖

工程範圍說明
中山北路6段88號至200號

主辦機構應辦事項
中山北路6段88號至200號瓦斯管線抽工程

配合參與






四、管線挖掘整合標準作業流程圖(機動性整合)




109. 9. 28 簽准實施

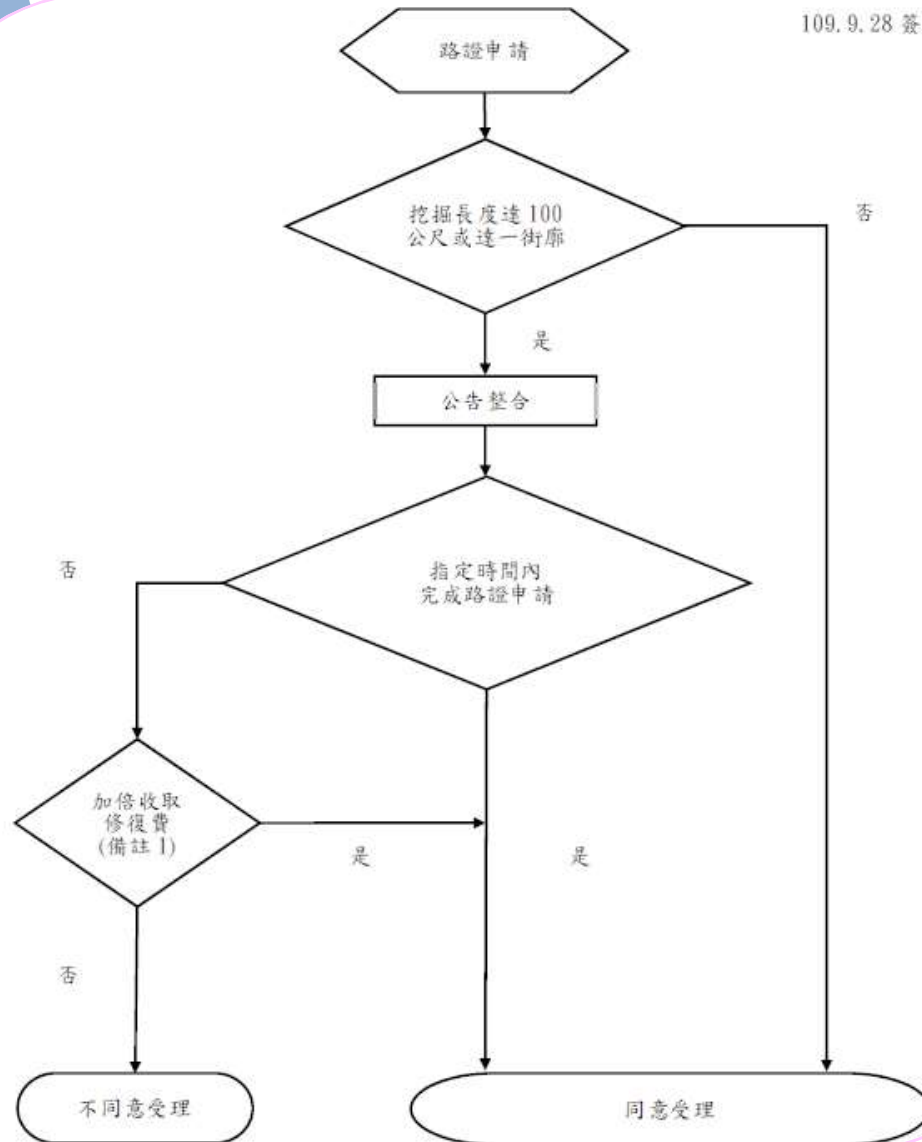

備註：

1、依據臺北市道路挖掘各項費用收費標準第7條第3項第2款規定，主管機關指定應進行管線挖掘整合之路段，申請人逾主管機關公告指定之時間，使提出申請，致延誤整合作業之進行，加一倍計收。



管線挖掘整合(P)(1/3)



整合P開頭


由中心參訓合格人員使用道路管線中心模組


進入道路
管線中心
模組

整合作業


機動性確
認整合

檢視





管線挖掘整合(P)(2/3)



回首頁 施工動態影像 施工管理 整合作業 公告事項 修改密碼

整合作業 / 機動性整合確認 >

查詢條件

| | | | |
|-------|----------------------|--------|---|
| 整合編號 | <input type="text"/> | 整合會議日期 | <input type="text"/> ~ <input type="text"/> |
| 地點關鍵字 | <input type="text"/> | 確認狀態 | 未確認 ▾ |
| | | 截止整合日期 | <input type="text"/> ~ <input type="text"/> |


查詢

取消重輸

共計：19筆

1 2

| 序號 | 整合編號 | 通知整合日期 | 整合會議日期 | 截止整合日期 | 整合範圍 | 是否參與 | 確認時間 | 確認單位 | 參與整合單位 | 檢視 |
|----|--------------|-----------|-----------|-----------|--|------|------|-------|--------|----|
| 1 | B106-0065-01 | 109/11/09 | | 109/12/09 | 因使照申請需進行建案周邊復舊工程(AC鋪設工程)，申請機動整合讓後續單位盡快施工完成後，進行AC鋪設。 | | | 12/89 | | |
| 2 | P10900823 | 109/10/19 | 109/10/19 | 109/11/30 | 羅斯福路6段20號至36號旁及景福街1號前、8號前、14號前、16號前、20號前、26號旁、42號前一帶 | | | 9/89 | | |



管線挖掘整合(P)(3/3)



臺北市道路挖掘管理系統 道路管線中心模組

駐點單位：交工處 使用者：廖光昭 登出


回首頁 施工動態影像 施工管理 - 整合作業 - 公告事項 - 修改密碼

整合作業 / 機動性整合確認 >

| | | | | | | | |
|--------|--|--------|-----------|--------|--------------------|--------|-----------|
| 整合編號 | P10900906 | 通知整合日期 | 109/11/13 | 整合會議日期 | 109/11/13 | 截止整合日期 | 109/11/20 |
| 整合範圍說明 | 正和里光復南路443巷口至443巷8號路面更新工程 預定施工時間：109/11/09-109/12/08 養護第二分隊聯絡人 郭威軒工程司 電話 27930149 | | | | | 施工範圍圖 | |
| 備註 | 1.經道管中心電詢養護分隊上開工程即將進場施作。2.請有申挖需求之管線單位(監視系統、架空纜線...等)速向養護第二分隊聯絡人 郭威軒工程司(電話 27930149)洽詢開工日期並登錄系統與提送挖掘申請書，若不配合者亦請回復錄卷，俾據控管。 | | | | | | |
| 是否參與 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 確認人員 | 林昆賢 | 確認時間 | 109/11/13 15:42:14 | | |

配合單位





建案五大管線整合(B)

回首頁 施工動態影像 施工管理 整合作業 公告事項 修改密碼

整合作業 / 機動性整合確認 >

| | | | | | | | |
|--------|--|--------|-----------|--------|--------|-----------|---|
| 整合編號 | B106-0065-01 | 通知整合日期 | 109/11/09 | 整合會議日期 | 截止整合日期 | 109/12/09 | |
| 整合範圍說明 | 因使照申請需進行建案周邊復舊工程(AC鋪設工程),申請機動整合讓後續單位盡快施工完成後,進行AC鋪設。 | | | | | 施工範圍圖 |  |
| 備註 | 機動性整合申請 聯絡人: 陳冠宇 電話: 0919015799 | | | | | | |
| 是否參與 | <input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/> 是 | 確認人員 | 確認時間 | | | | |

儲存 前一頁





臨時動議



為落實配合辦理本處道路更新及管線挖掘整合期程精進方案宣導會議

簽到表



一、 時間：109 年 11 月 23 日（星期一）上午 10 時 30 分

二、 地點：道管中心 2 樓會議室（臺北市中正區和平西路 1 段 59 號）

三、 主席：

紀錄：林玉婷

四、 簽到：

| 單位 | 職稱 | 姓名 |
|-------------------------------------|---|---|
| 國防部參謀本部資通電軍指揮部資訊通聯隊第一大隊資通作業二中隊網傳作業隊 | | |
| 空軍台北通信資訊大隊 | | |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部 台北營業處 |  |  |
| 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 工程師 " | 洪敏峰 于端平 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部 | | |
| 陽明山瓦斯股份有限公司 | 課長 | 王繼賢 |
| 欣欣天然氣股份有限公司 | 經理 科長 | 許志雄 黃強生 |
| 欣湖天然氣股份有限公司 | 科長 | 于森倚 |
| 大台北區瓦斯股份有限公司 | 襄理 | 顏貽錦 吳雙 |
| 微笑單車股份有限公司 | | |
| 臺北大眾捷運股份有限公司 | 課長 | 王明詮 |

| 單位 | 職稱 | 姓名 |
|--------------------------|------------------|------------|
| 台灣電力股份有限公司台北南區營業處 | 課長 | 李耀晃 |
| 台灣電力股份有限公司台北市區營業處 | 經理 林清 | 陳郁凡 |
| 台灣電力股份有限公司台北北區營業處 | 經理 | 江聰寧 |
| 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 | 經理 | 張明山 |
| 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處 | 課長 | 黃士逢 |
| 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司臺北營運處 | 科長 股長 | 吳幸緯 楊舒田 |
| 台灣大哥大股份有限公司 | 副理 | 蔣明陽 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 員工 | 陳淑萍 |
| 亞太電信股份有限公司 | 司理 | 蔣文斌 |
| 台灣固網股份有限公司 | 副理 | 蔣明陽 |
| 新世紀資通股份有限公司 | 員工 | 陳淑萍 |
| 台灣智慧光網股份有限公司 | 員工 | 林偉才 |
| 麗冠有線電視股份有限公司 | 經理 | 蔡文吉 |
| 長德有線電視股份有限公司 | | 白新民 |
| 萬象有線電視股份有限公司 | | 白新民 |
| 聯維有線電視股份有限公司 | 專員 | 洪俊彬 |

林清

| 單位 | 職稱 | 姓名 |
|----------------|------------|------------|
| 新台北有線電視股份有限公司 | 經理 | 馬憲忠 |
| 金頻道有線電視股份有限公司 | 經理 | 連錫德 |
| 陽明山有線電視股份有限公司 | 經理 | 王榮炎 |
| 大安文山有線電視股份有限公司 | 副理 | 周啟文 |
| 北都數位有線電視股份有限公司 | 協理 | 馬耀華 |
| 臺北市建築師公會 | | |
| 臺灣區綜合營造業同業公會 | | |
| 台北市不動產開發商業同業公會 | | |
| 中華民國建築經理商業同業公會 | | |
| 臺北市政府警察局 | 專員 李松平 | 王辰星 何可村 |
| 臺北市政府民政局 | | |
| 臺北市政府社會局 | 主任 | 詹丕文 |
| 臺北市政府環境保護局 | 分隊長 分隊長 | 張建義 李洲璋 |
| 臺北市政府捷運工程局 | | |
| 臺北市交通管制工程處 | 隊長 | 黃朝斌 |
| 臺北市停車管理工程處 | 正工程司 | 林培豐 |

| 單位 | 職稱 | 姓名 |
|----------------|------|---------|
| 臺北市公共運輸處 | 科長 | 陳靜 蔣宇禎 |
| 臺北市商業處 | 科員 | 吳健良 |
| 臺北市建築管理工程處 | | |
| 臺北自來水事業處 | 正工程司 | 黃裕壽 嚴嘉璈 |
| 臺北自來水事業處東區營業分處 | 主任 | 江川江 游毅研 |
| 臺北自來水事業處西區營業分處 | 股長 | 張姣雅 |
| 臺北自來水事業處南區營業分處 | 專員 | 文其正 |
| 臺北自來水事業處北區營業分處 | 股長 | 潘永星 |
| 臺北自來水事業處陽明營業分處 | 股長 | 周宗榮 |
| 臺北自來水事業處工程總隊 | 科長 | 廖倍誠 |
| 臺北市政府警察局交通警察大隊 | 警員 | 蔡雅 |
| 臺北市松山區公所 | | |
| 臺北市大安區公所 | 技佐 | 姜寧 |
| 臺北市大同區公所 | 技佐 | 李俊金 |
| 臺北市中山區公所 | | |
| 臺北市內湖區公所 | | |

| 單位 | 職稱 | 姓名 |
|--------------------|-----------|------------|
| 臺北市南港區公所 | | |
| 臺北市士林區公所 | 課員 | 林筱發 |
| 臺北市北投區公所 | | |
| 臺北市信義區公所 | 主任 | 陳俊台 |
| 臺北市中正區公所 | | |
| 臺北市萬華區公所 | 課員 | 陳書迪 |
| 臺北市文山區公所 | | |
| 臺北市政府工務局水利工程處 | 幫工程司 | 陳泰元 |
| 臺北市政府工務局大地工程處 | 股長 | 王信山 |
| 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 股長 | 邱俊賢 曹耀廷 |
| 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 科長 | 曾威愷 |
| 臺北市政府工務局新建工程處工務科 | 科長 | 蕭志龍 |
| 臺北市政府工務局新建工程處維護科 | 正工 工程師 | 陳錦珍 陳星宇 |
| 臺北市政府工務局新建工程處養護工程隊 | | 2分 郭明 黃建華 |
| | | 彭耀華 |
| | | 6分隊 陳明倫 |

管線挖掘整合會議水處協請事項

一、統計資料

北水處 109 年 7 至 10 月自行巡查地下式消防栓，遭埋沒 575 件。因地下式消防栓涉及公共緊急救災需求，如消防單位於火警救災時災害現場地下消防栓因施工單位施工後造成掩蓋影響救災，經消防單位提報，公司負責人將以刑罰論處。

二、消防、新工處相關法規

- (一). 臺北市道路挖掘施工維護管理要點第四條，(二) 依挖掘性質所需證明文件 1.計畫性挖掘整合會議紀錄、施工路段既設消防栓、瓦斯管閥蓋數量之會勘紀錄。
- (二). 臺北市道路挖掘施工維護管理要點第十三條，施工範圍內有消防栓、瓦斯閥及自來水閥類設施，應逕洽本府消防局、臺北自來水事業處或瓦斯公司確認，且施工中不得予以損壞或覆蓋。
- (三). 消防法第36條第5款「妨礙消防栓使用」，行為人如埋沒消防栓，由消防局轄區分隊填具舉發單，逕送裁罰。

三、建議於路證備註欄內加註說明

本處已與貴處及消防局針對本處閥栓遭其他道路施工單位施工掩埋問題，進行多次研討，感謝貴處指導；建議路證備註欄內加註說明內容為：「**銑鋪路段大於 100 公尺之工程，施工前及銑鋪復舊後，請洽本府消防局及臺北自來水事業處辦理消防栓確認會勘。如有消防栓埋沒情形，而未通知臺北自來水事業處辦理提升，主管機關得依消防法開立舉發單**」。
